



Cartagena de Indias, D. T. y C., once (11) de Octubre de 2013.

TC-DJ- 07.01-0770 -2013

Señor:

RUBEN ORLANDO CHACON GIRALDO
Coordinador de Planeación y Proyectos
SOMOS K S.A.

Centro Comercial Ronda Real, oficina 505

Tel. (1) 4533068

Email: rchacon@somos.co

Ciudad

Referencia. Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-LPN-003-2013.

Respetado Señor Chacon;

A través del presente nos permitimos dar respuesta a su derecho de petición de fecha 8 de octubre de 2013, correo electrónico a la 1:33 p.m., en el mismo orden en que fueron presentadas las observaciones al interior del proceso de selección de la referencia:

SOLICITUD:

Cordial saludo, Con fundamento en lo señalado por el artículo 23 de la constitución política Colombiana y las demás normas que reglamentan el derecho fundamental de petición, nos permitimos solicitar un informe de Interventoría de las obras del tramo 5A y de alguna otra obra que este pendiente por terminarse para que el SITM pueda operar, además de los cronogramas para entrega de estas. Esta información es requerida para poder dar respuesta a las aseguradoras que están solicitando garantías para poder expedir las pólizas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA: Adjunto a esta comunicación el informe rendido por el Director de Planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A., Supervisor.

Cordialmente,

TANIA DIAZ SABBAGH

SECRETARIA GENERAL TRANSCARIBE S.A

La presente comunicación es suscrita por la Secretaria General de Transcaribe S.A. con fundamento en las facultades otorgadas por la Gerencia de esta entidad mediante Resolución No. 022 de 2006.

Proyectó:


ERCILIA BARRIOS FLOREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica



INFORME DE AVANCE PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA "TRANSCARIBE"

La construcción de la infraestructura física del proyecto para iniciar la operación del Sistema se encuentra en un 95% de avance.

Obras contratadas:

TRAMO 5A

Mediante Resolución No.093 del 16 de julio de 2013, Transcaribe S.A. adjudicó la Licitación Pública Nacional TC-LPN-001-13, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO Y EL SECTOR DE LA SUBIDA A LA POPA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN VAGÓN W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL a la Unión Temporal Cartagena 2013.

El Acta de Inicio se suscribió el 15 de Agosto de 2013
El Plazo del Contrato es de 10.5 meses

La ejecución de este contrato se encuentra dividido en cuatro etapas (4) etapas, así:

- ETAPA PRELIMINAR.- Con una duración de dos meses a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. En esta etapa se adelantan las labores previas a la construcción tales como:
 - Actualización de Actas de Vecindad.
 - Implementación del Plan de Manejo Ambiental.
 - Replanteo topográfico del proyecto.
 - Inventario de Redes de Servicios públicos.
 - Línea Base del Plan de Manejo de Tráfico.
 - Señalización y demarcación de la zona de Obra.
 - Adecuación de vías para desvíos.

¡AHORA SÍ, CARTAGENA!

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 6665217
www.transcaribe.gov.co





- Implementación Plan de Manejo de Tráfico
 - Instalación de Oficina de atención a comunidad **C.O.A.C.**
 - Reuniones de inicio de obra y de PMT (socialización).
 - Confirmación de Comité de líderes COAC.
 - Instalación de vallas fijas y móviles.
 - Actualización de actas de vecindad.
 - Registro filmico y fotográfico de desvíos.
 - Conformación de Comité de mano de obra no calificada.
 - Socializaciones puerta a puerta
- **ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.-** Con una duración de siete (7) meses para ejecutar la obra. Durante esta etapa el Contratista deberá realizar las siguientes actividades de obra:
 - Terminación Glorieta de los Chivos.
 - Construcción de losas faltantes en la calzada norte.
 - Construcción de Carriles Solobus en la Calzada Sur.
 - Demolición del puente Vehicular Bazurto.
 - Construcción de Glorieta Semaforizada Bazurto.
 - Construcción vagón W12 en la estación delicias.
 - **ETAPA DE RECIBO FINAL.-** Con una duración de quince días
 - **ETAPA DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS.-** Con una duración de un mes

CONCESION PORTAL DE TRANSFERENCIA, PATIO Y TALLER

Mediante Resolución No.055 del 21 de enero de 2011, Transcaribe S.A. adjudicó la Licitación Pública Nacional TC-LPN-004-10, cuyo objeto es la CONCESION PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y

¡AHORA SÍ, CARTAGENA!

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 6665217
www.transcaribe.gov.co






OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE al Sociedad Portal Calicanto S.A.S.

El hito No.1 construcción del tramo de corredor entre final Tramo 4 y acceso a Patio Portal finalizó el 31 de Enero. El contrato se encuentra suspendido para desarrollo de los restantes hitos No.2 y No.3, hasta la adjudicación de los contratos de Operación del SITM que se estima para el 28 de noviembre de 2013.

Una vez reactivadas las obras de construcción se estima que en siete meses se termine la construcción del hito No.2 y del hito No.3.


FELIPE S. PAZ ESPINOSA
Director Planeación e Infraestructura

Proyectó: Ing. Jurady Guerra Flórez
Asesor Externo

¡AHORA SÍ, CARTAGENA!

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 – 6665217
www.transcaribe.gov.co



CRONOGRAMA OBRAS FALTANTES TRAMO 5 A. GLORIETA SEMAFORIZADA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA FALTANTES DEL SISTEMA.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		2º semestre	
					feb/mar/abr/may/jun	ago/sep/oct/nov/dic/en	feb/mar/abr/may/jun	ago/sep/oct/nov/dic/en
31	Construcción de contenedores de raíces y terminación de existentes	5 días	mié 16/10/13	lun 21/10/13				
32	3. SECTOR COSTADO SUR 2 (K5+460/810) EJE MI5	41 días	mié 16/10/13	lun 02/12/13				
33	3.1 Pavimentos	26 días	mié 16/10/13	jue 14/11/13				
34	Demolición y retiro de pavimento existente	5 días	mié 16/10/13	lun 21/10/13				
35	Excavación	5 días	mar 22/10/13	sáb 26/10/13				
36	Colocación Base en Triturado	6 días	lun 28/10/13	sáb 02/11/13				
37	Construcción Losas de Concreto mixtos y solo bus	10 días	lun 04/11/13	jue 14/11/13				
38	3.2 Estructura	10 días	vie 15/11/13	mar 26/11/13				
39	Protección Colector San Felipe	10 días	vie 15/11/13	mar 26/11/13				
40	3.3 Redes Húmedas	5 días	mié 27/11/13	lun 02/12/13				
41	Limpieza canal lateral existente (Descarga a Canal Pinzón)	5 días	mié 27/11/13	lun 02/12/13				
42	FASE 2	95 días	mar 03/12/13	sáb 22/03/14				
43	1. SECTOR COSTADO SUR 3 K5+000/460 EJE MI5- CARRILSOLOBUS	25 días	mar 03/12/13	mar 31/12/13				
44	1.1 Estructuras	10 días	mar 03/12/13	vie 13/12/13				
45	Construcción Box-cubverts Carrillo, Icollantas y Colonial	10 días	mar 03/12/13	vie 13/12/13				
46	1.2 Pavimentos (Solo bus)	15 días	sáb 14/12/13	mar 31/12/13				
47	Nivelación concreto pobre carriles solo-bus	5 días	sáb 14/12/13	jue 19/12/13				
48	Construcción losas de concreto carriles solo-bus	10 días	vie 20/12/13	mar 31/12/13				
49	2. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA (Delicias)	85 días	mar 03/12/13	mar 11/03/14				
50	Construcción De Cementaciones Y Rampas	60 días	mar 03/12/13	lun 10/02/14				
51	Prefabricación, Suministro Y Montaje De Vagones	15 días	mar 11/02/14	jue 27/02/14				
52	Prefabricación, Suministro Y Montaje De Elementos De Remate (Cielo Razo Y Cubiertas)	10 días	vie 28/02/14	mar 11/03/14				
53	Instalación De Red Eléctrica, Cuarto Eléctrico, Red De Datos Y Sistema De Iluminación	10 días	vie 28/02/14	mar 11/03/14				
54	3. CONSTRUCCIÓN GLORIETA SEMAFORIZADA (CALZADA NORTE)	95 días	mar 03/12/13	sáb 22/03/14				
55	3.1 PRELIMINARES	8 días	mar 03/12/13	mié 11/12/13				
56	Cerramiento con polsombra	4 días	mar 03/12/13	vie 06/12/13				
57	Localización y replanteo	4 días	sáb 07/12/13	mié 11/12/13				
58	3.2 URBANISMO Y ARQUITECTUR	87 días	jue 12/12/13	sáb 22/03/14				
59	DEMOLICIONES Y RETIROS	10 días	jue 12/12/13	lun 23/12/13				

Proyecto: CRONOGRAMA TRAMO 5A
Fecha: mar 15/10/13

Tarea [Barra]

División [Barra]

Hito [Diamante]

Resumen [Barra]

Resumen del proyecto [Barra]

Tareas externas [Barra]

Hito externo [Diamante]

Tarea inactiva [Barra]

Hito inactivo [Diamante]

Resumen inactivo [Barra]

Tarea manual [Barra]

Solo duración [Barra]

Informe de resumen manual [Barra]

Resumen manual [Barra]

Solo el comienzo [Barra]

Solo fin [Barra]

Progreso [Barra]

Fecha limite [Barra]

Página 2

CRONOGRAMA OBRAS FALTANTES TRAMO 5 A. GLORIETA SEMAFORIZADA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA FALTANTES DEL SISTEMA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		2° semestre			
					feb-mar-abr-may-jun-jul	ago-sep-oct-nov-dic	ene-feb-mar-abr-may-jun-jul	ago-sep-oct-nov-dic		
91	3.4 REDES SECAS TELECOMUNICACION	13 días	jue 12/12/13	jue 26/12/13						
92	FIBRA ÓPTICA PROMITEL	8 días	jue 12/12/13	vie 20/12/13						
93	Ducteria	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
94	Tendido y empalmes	3 días	mié 18/12/13	vie 20/12/13						
95	FIBRA ÓPTICA TRANSCARIBE	8 días	jue 12/12/13	vie 20/12/13						
96	Ducteria	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
97	Tendido y empalmes	3 días	mié 18/12/13	vie 20/12/13						
98	CCTV DISTRISEGURIDAD	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
99	Ducteria	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
100	FIBRA ÓPTICA SEMAFORIZACION	8 días	jue 12/12/13	vie 20/12/13						
101	Ducteria	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
102	Tendido y empalmes	3 días	mié 18/12/13	vie 20/12/13						
103	COSTAVISION	8 días	jue 12/12/13	vie 20/12/13						
104	Ducteria	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
105	Cableado y conexione	3 días	mié 18/12/13	vie 20/12/13						
106	FIBRA ÓPTICA TELECOM	13 días	jue 12/12/13	jue 26/12/13						
107	Retirada cableado existient	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
108	Tendido y empalmes	6 días	mié 18/12/13	jue 26/12/13						
109	TELEFONIA EN COBRE TELECOM	8 días	jue 12/12/13	vie 20/12/13						
110	Ducteria	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
111	Tendido y empalmes	3 días	mié 18/12/13	vie 20/12/13						
112	3.5 REDES ELECTRICA	31 días	jue 12/12/13	jue 16/01/14						
113	DESMONTAJE RED DE MEDIA-BAJA Y ALUMBRADO PUBLICO	10 días	jue 12/12/13	lun 23/12/13						
114	Desmontaje red de Media y Baja	5 días	jue 12/12/13	mar 17/12/13						
115	Desmontaje red de Alumbrad	5 días	mié 18/12/13	lun 23/12/13						
116	RED DE MEDIA TENSIÓN PROYECTAD	31 días	jue 12/12/13	jue 16/01/14						
117	Canalizaciones (aerea y enterrada)	15 días	jue 12/12/13	sáb 28/12/13						
118	Cableado y conexione	8 días	lun 30/12/13	mar 07/01/14						
119	Transformadore	8 días	mié 08/01/14	jue 16/01/14						
120	RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA	24 días	jue 12/12/13	mié 08/01/14						
121	Ejecución de canalizaciones, postes, registros...	20 días	jue 12/12/13	vie 03/01/14						

Proyecto: CRONOGRAMA TRAMO 5A
 Fecha: mar 15/10/13

Tarea: []
 División: []
 Hilo: []
 Resumen: []
 Resumen del proyecto: []

Tareas externas: []
 Hilo externo: []
 Tarea inactiva: []
 Hilo inactivo: []
 Resumen inactivo: []

Tarea manual: []
 Sólo duración: []
 Informe de resumen manual: []
 Resumen manual: []
 Sólo el comienzo: []

Sólo fin: []
 Progreso: []
 Fecha límite: []



CRONOGRAMA OBRAS FALTANTES TRAMO 5 A. GLORIETA SEMAFORIZADA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA FALTANTES DEL SISTEMA.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre		2° semestre		1er semestre	2° semestre																
					feb	mar	abr	may			jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb							
153	Ejecución de áreas vehiculares	8 días	lun 24/03/14	mar 01/04/14																						
154	Rampas vehiculares	5 días	lun 24/03/14	vie 28/03/14																						
155	MOBILIARIO	4 días	mar 25/03/14	vie 28/03/14																						
156	Contenedores, alcohóles, materas	4 días	mar 25/03/14	vie 28/03/14																						
157	Canecas, Bolardos, Cabinas y baranda peatona	4 días	mar 25/03/14	vie 28/03/14																						
158	PLAZOLETAS, PARQUES Y PLAZAS	35 días	lun 24/03/14	vie 02/05/14																						
159	Adoquinado	35 días	lun 24/03/14	vie 02/05/14																						
160	SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIA	5 días	lun 24/03/14	vie 28/03/14																						
161	Señalización Vertical y letteros	5 días	lun 24/03/14	vie 28/03/14																						
162	Señalización Horizontal y cebreado	5 días	lun 24/03/14	vie 28/03/14																						
163	Tachones y Delmeadore	5 días	lun 24/03/14	vie 28/03/14																						
164	1.3 ESTRUCTURA	15 días	lun 24/03/14	mié 09/04/14																						
165	DEMOLICION PUENTE BAZURT	15 días	lun 24/03/14	mié 09/04/14																						
166	Demolición de Pavimento y barand	6 días	lun 24/03/14	sáb 29/03/14																						
167	Demolición de Tabler	3 días	lun 31/03/14	mié 02/04/14																						
168	Demolición de Viga	3 días	jue 03/04/14	sáb 05/04/14																						
169	Demolición de muros y estribos	3 días	lun 07/04/14	mié 09/04/14																						
170	1.4 REDES HUMEDAS	9 días	jue 10/04/14	sáb 19/04/14																						
171	ALCANTARILLADO	9 días	jue 10/04/14	sáb 19/04/14																						
172	Excavaciones y relleno	3 días	jue 10/04/14	sáb 12/04/14																						
173	Instalación de Tubería	3 días	lun 14/04/14	mié 16/04/14																						
174	Ejecución de registros, acometidas y empalme	3 días	jue 17/04/14	sáb 19/04/14																						
175	DRENAJES PLUVIALES	9 días	jue 10/04/14	sáb 19/04/14																						
176	Excavaciones y relleno	3 días	jue 10/04/14	sáb 12/04/14																						
177	Instalación de Tubería	3 días	lun 14/04/14	mié 16/04/14																						
178	Ejecución de cámaras, sumideros, rejillas...	3 días	jue 17/04/14	sáb 19/04/14																						
179	GAS	6 días	jue 10/04/14	mié 16/04/14																						
180	Excavaciones y relleno	3 días	jue 10/04/14	sáb 12/04/14																						
181	Instalación de Tubería	3 días	lun 14/04/14	mié 16/04/14																						
182	1.5 REDES SECAS TELECOMUNICACION	8 días	jue 10/04/14	vie 18/04/14																						
183	FIBRA OPTICA PROMITE	6 días	jue 10/04/14	mié 16/04/14																						

Proyecto: CRONOGRAMA TRAMO 5A
 Fecha: mar 15/10/13

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo


Sólo fin

Progreso

Fecha límite

CRONOGRAMA OBRAS FALTANTES TRAMO 5 A. GLORIETA SEMAFORIZADA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PARADA FALTANTES DEL SISTEMA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre			2º semestre			1er semestre			2º semestre												
					feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
215	Ejecución nuevas estructuras	8 días	jue 10/04/14	vie 18/04/14																						
216	Instalación de cablead	10 días	sáb 19/04/14	mié 30/04/14																						
217	Retirada cableado existient	4 días	jue 01/05/14	lun 05/05/14																						
218	Demolición de estructuras existentes	4 días	mar 06/05/14	vie 09/05/14																						
219	1.7 PAVIMENTO	30 días	jue 10/04/14	mié 14/05/14																						
220	PRELIMINARES	30 días	jue 10/04/14	mié 14/05/14																						
221	Excavaciones, rellenos y formación subrasant	3 días	jue 10/04/14	sáb 12/04/14																						
222	Ejecución de sardinele	5 días	mié 30/04/14	lun 05/05/14																						
223	Instalación de geotextiles y geodren	8 días	mar 06/05/14	mié 14/05/14																						
224	CARRIL TRANSCARIBE	14 días	lun 14/04/14	mar 29/04/14																						
225	Relleno inturado calizo	4 días	lun 14/04/14	jue 17/04/14																						
226	Ejecución de Mezcla asfáltic	2 días	vie 18/04/14	sáb 19/04/14																						
227	Ejecución de Losas de concreto	8 días	lun 21/04/14	mar 29/04/14																						
228	CARRILES MIXTO	12 días	lun 14/04/14	sáb 26/04/14																						
229	Relleno Piedra Cíclope	4 días	lun 14/04/14	jue 17/04/14																						
230	Ejecución de Losas de concreto	8 días	vie 18/04/14	sáb 26/04/14																						
231	1.8 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	15 días	lun 28/04/14	mié 14/05/14																						
232	SEÑALIZACION GENERAL	15 días	lun 28/04/14	mié 14/05/14																						

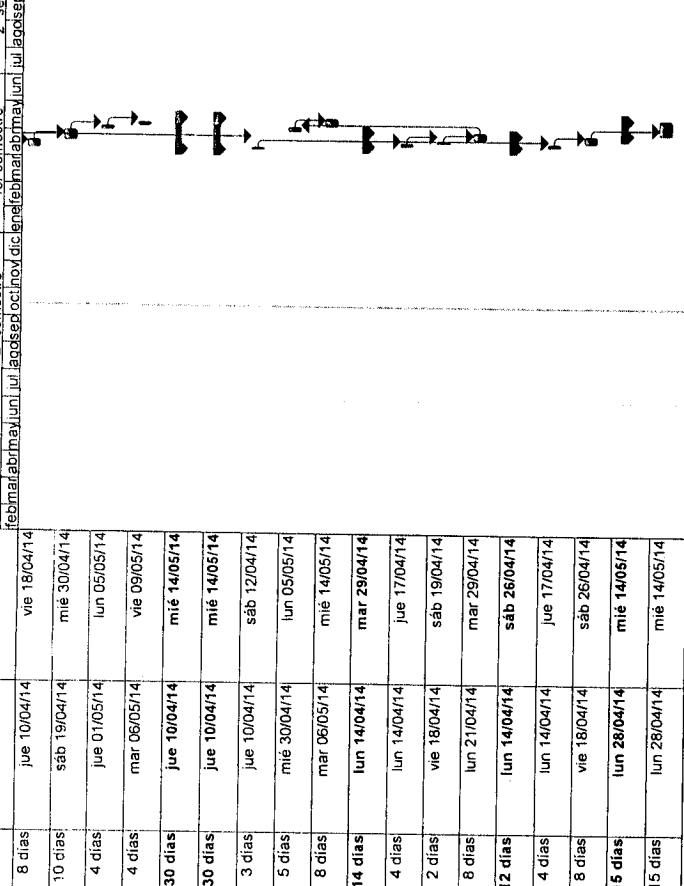

■ Tarea
■ División
◆ Hito
▬ Resumen
▬ Resumen del proyecto

■ Tareas externas
◆ Hito externo
▬ Tarea inactiva
▬ Hito inactivo
▬ Resumen inactivo

▬ Tarea manual
▬ Sólo duración
▬ Informe de resumen manual
▬ Resumen manual
▬ Sólo el comienzo

▬ Sólo fin
▬ Progreso
▬ Fecha límite

Proyecto: CRONOGRAMA TRAMO 5A
 Fecha: mar 15/10/13
